

**Projekt:**

# Erweiterung Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule

Bericht Nr.: 1 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2015**

## 1.1 Projektbeschreibung:

Im Norden des Bestandsgebäudes der Otto-Hahn-Realschule wird ein zweigeschossiger Neubau mit einer punktuellen, barrierefreien Anbindung im Obergeschoss errichtet. Untergebracht werden im künftigen Erweiterungsbau die Mensa, Musikräume, drei Naturwissenschaftliche Räume, ein Ruhe- und Bewegungsraum sowie die Räume für Soziales Lernen und ein Lehrerbereich.

Die Mensa wurde gleichzeitig als Multifunktionsraum genehmigt, der in Kombination mit dem angrenzenden Musikbereich als Aufführungsraum für Musik- und Theaterveranstaltungen gemäß dem pädagogischen Konzept (Schwerpunkt Musik und Theater) genutzt werden kann. Dieser Bereich wird auch künftig den neuen Mittelpunkt der Schule darstellen.

Die Theater- und Musikwerkstatt wird im vorhandenen Raumbestand untergebracht. Im Gegenzug hat das Regierungspräsidium Freiburg der vollständigen Verlagerung des naturwissenschaftlichen Bereichs in den Neubau zugestimmt.

Nach den Schulbauförderrichtlinien werden 1264 qm gefördert. Für das Projekt kann von einem Zuschuss von rd. € 1.084.000 ausgegangen werden. Hinzu kommt noch ein Zuschuss für die späteren Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude.

Auch städtebaulich wird durch den Neubau eine Verbesserung erreicht. Der bisher offene Pausenhofbereich wird durch den Neubau nun auch auf der Nordseite, somit dreiseitig, gefasst und öffnet sich Richtung Süden zum Grünbereich.



<b><u>Bauherr:</u></b>	Stadt Lahr Rathausplatz 4 77933 Lahr
<b><u>Projektkosten:</u></b>	ca. 5,3 Mio € brutto (incl. Baunebenkosten)
<b><u>Projektlaufzeit:</u></b>	12/2014 - 08/2016 (Bauphase)
<b><u>Projektdaten:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erweiterungsbau zweigeschossig</li><li>▪ 2300 m<sup>2</sup> BGF</li><li>▪ 2047 m<sup>2</sup> Nutzfläche</li></ul>
<b><u>Fördermittel:</u></b>	Schulbauzuschuss des Landes von ca. 1,08 Mio €

**Projekt:**

**Erweiterung Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule**

Bericht Nr.: 1 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2015**

**1.2 Projektstand:**

In seiner Sitzung am 14. Oktober 2013 hat der Gemeinderat die Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule beschlossen.

In der Sitzung am 28. April 2014 hat der Gemeinderat mit den Auftragsvergaben an die Ingenieurbüros die Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule erneut befürwortet. Die Planungsaufträge wurden sofort erteilt und die Planung vorangetrieben.

Seit diesem Zeitpunkt fanden regelmäßig alle zwei Wochen Planungs-Jourfixes statt. Hier waren hauptsächlich die Architekten, die Fachplaner und das Technische Gebäudemanagement beteiligt. In enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales, Schulen und Sport waren zu bestimmten Punkten in Anwesenheit eines Vertreters die Nutzerbelange zu berücksichtigen.

Die Ergebnisse aller dieser Besprechungen wurden schließlich gemeinsam mit allen Beteiligten in mehreren Sitzungen Vertretern der Schule präsentiert und mit diesen abgestimmt. Notwendige und sinnvolle Änderungen wurden aufgenommen und in die Pläne eingearbeitet.

Anfang August 2014 wurde das Baugesuch eingereicht.

Der vorgesehene Anbau der Realschule liegt in den Geltungsbereichen der beiden Bebauungspläne MAUERFELD OST von 1973 und MAUERFELD OST, 2. Änderung, von 2009. Sie setzen für den Bereich Flächen für den Gemeinbedarf (Schulen etc.) fest. Der Anbau lag außerhalb der Baufenster. An der Stelle waren ein Schulhof bzw. Freiflächen um das Hallensportzentrum vorgesehen.

Daher war eine Bebauungsplanänderung notwendig um den Anbau genehmigen zu können. Da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelte, konnte diese in einem Verfahrensschritt durchgeführt werden.

Baubeginn war im Dezember 2014. Am 03.02.2015 konnte der offizielle Spatenstich stattfinden. Anfang März wurde mit den Schalungsarbeiten begonnen. Das Erdgeschoss ist zwischenzeitlich fertig gestellt.


**Projekt:**

**Erweiterung Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule**

Bericht Nr.: 1 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2015**

**1.3 Projektbeteiligte:**

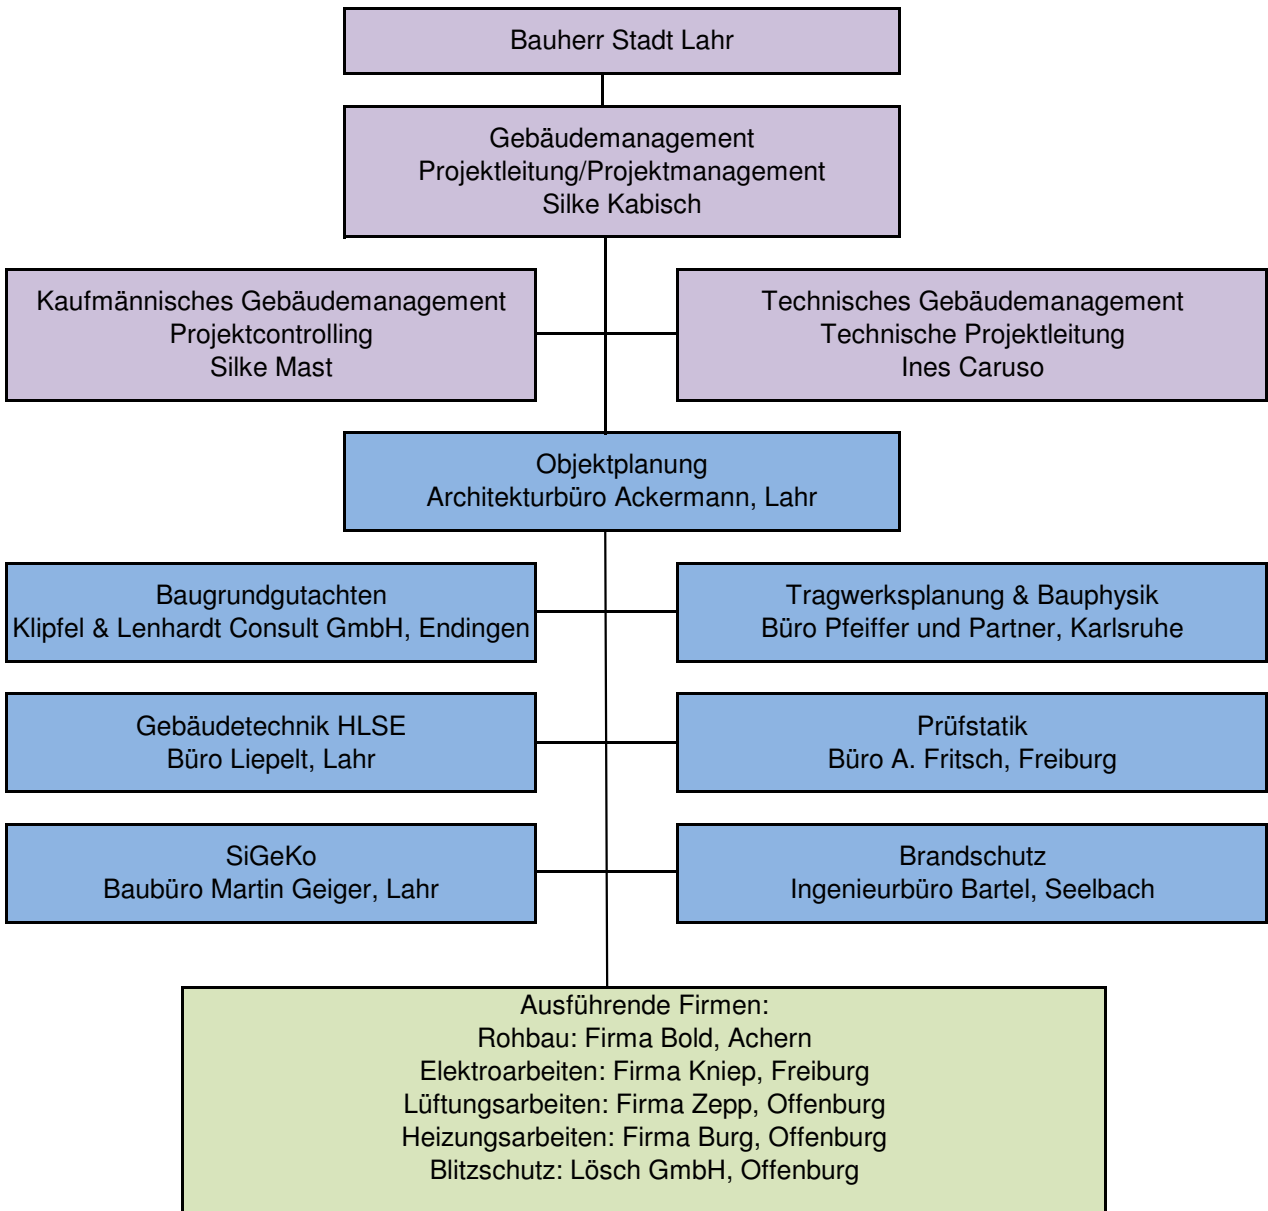

**Projekt:**

**Erweiterung Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule**

Bericht Nr.: 1 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2015**

**2.1 Qualitätssteuerung:**

**Legende:**

Erläuterung Risikoeinstufung:  
 W = Eintrittswahrscheinlichkeit  
 S = Schadensausmaß

<b>W4</b>	niedrig	mittel	hoch	hoch
<b>W3</b>	niedrig	mittel	mittel	hoch
<b>W2</b>	niedrig	niedrig	mittel	mittel
<b>W1</b>	niedrig	niedrig	niedrig	niedrig
	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>S4</b>

Risikobeschreibung	Wer trägt Risiko?	Auswirkung			Risiko	Handlungsweise
			W	S		
<b>Allgemein:</b>						
Unzureichendes Projektmanagement Knowhow	Planer - Bauherr	Termine werden nicht eingehalten, Kosten nicht überprüft, LV falsch	3	3	mittel	Management vorab überprüfen, ggf. Hilfe geben - immer wieder nachfordern
Mangelnde Kommunikation	Planer - Bauherr	Falsche Materialien, Mengen und Bauweisen, Nichteinhalten von Terminen	2	3	mittel	Prozessabläufe genau definieren
Schlüsselperson fällt aus	Planer - Bauherr	Kompetenz fehlt	2	4	mittel	Lücke so schnell wie möglich füllen. "Vertretung" immer auf dem Laufenden halten
Vorschriften, Normen werden nicht eingehalten	Planer - Bauherr	Falsche Materialien, Mengen und Bauweisen	2	4	mittel	Überprüfen ob Vorschriften eingehalten werden
<b>Projektbezogene Risiken:</b>						
Mengenabweichung/ fehlende Positionen	Planer - Bauherr	Mehrmasse können sich negativ auf Kosten auswirken	2	4	mittel	genaue Überprüfung der Leistungsverzeichnisse

Aufgrund kontinuierlicher Analyse und Bearbeitung werden die Risiken auf ein Minimum reduziert. Die Qualität kann aufgrund der sorgfältigen Projektleitung und Projektsteuerung beibehalten werden.

- Qualitätsreduzierung     
  Qualitätsänderungen     
  Beibehaltung der Qualitätsvorgaben

**Projekt:**

# Erweiterung Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule

Bericht Nr.: 1


Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2015**

## 2.2 Terminsteuerung:

Leistungsphasen nach HOAI		Zeit (geplant)	Status
LPH 1	Grundlagenermittlung	5 Monate	Abgeschlossen
LPH 2	Vorplanung	7 Monate	Abgeschlossen
LPH 3	Entwurfsplanung	4 Monate	Abgeschlossen
LPH 4	Genehmigungsplanung	2,5 Monate	Abgeschlossen
LPH 5	Ausführungsplanung	5 Monate	In Bearbeitung
LPH 6	Vorbereitung der Vergabe	4 Monate	In Bearbeitung
LPH 7	Mitwirkung bei der Vergabe	6 Monate	In Bearbeitung
LPH 8	Objektüberwachung	14 Monate	In Bearbeitung
LPH 9	Objektbetreuung und Dokumentation	4 Jahre	Ab Feb. 2016

### Stand der Planungsleistung

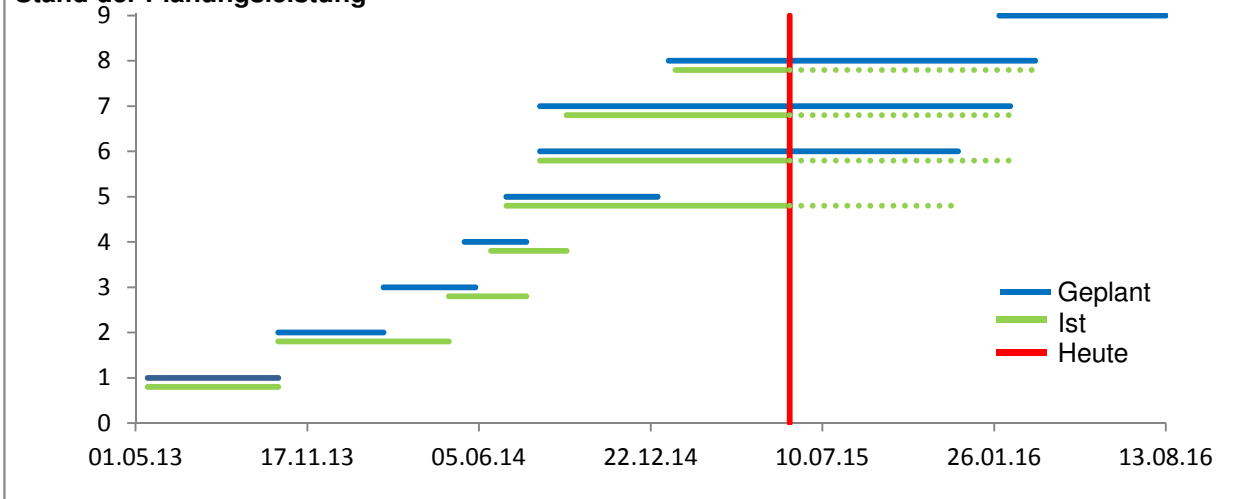

Vergabevorschriften, einschließlich der Befassung in den jeweiligen Gremien sind in der LPH 6 u. 7 berücksichtigt.


**Projekt:**

# Erweiterung Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule

Bericht Nr.: 1

Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2015**

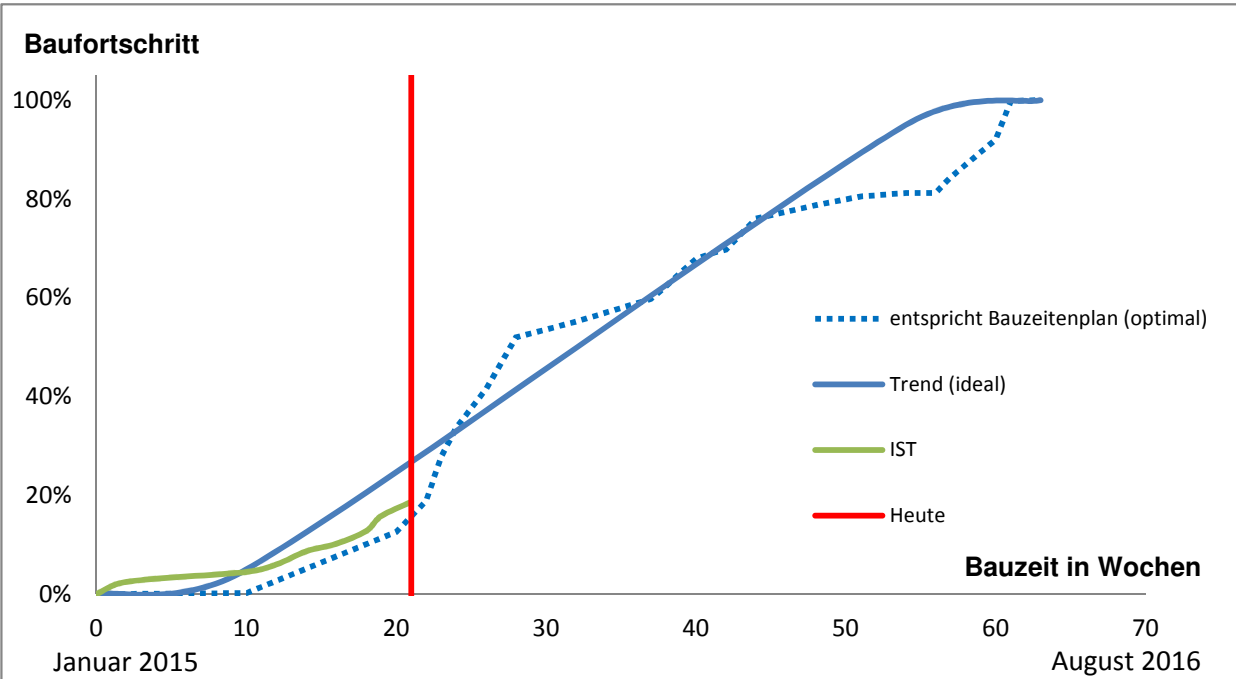

Aufgrund des vorgesehenen Baubeginns wurden die ersten Gewerke vor Beendigung der Ausführungsplanung in Auftrag gegeben. Dies hat zur Folge, dass die Phase 5 länger wie geplant läuft, verursacht aber keine Mehrkosten und insgesamt keine Bauzeitverlängerung. Die Baumaßnahme befindet sich im vorgesehenen Zeitfenster.



dauerhaft/kritische Abweichung



temporäre/unkritische Abweichung



planmäßig

**Projekt:**

## Erweiterung Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule

Bericht Nr.: 1

Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand:

08.06.2015

### 2.3 Kostensteuerung

Nr.	Gewerke	Kostenschätzung/Budget	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Prognose
200	Herrichten und Erschließen	134.000,00 €	134.000,00 €	134.000,00 €	108.000,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	3.001.500,00 €	2.629.605,00 €	2.458.765,00 €	2.557.065,00 €
400	Bauwerk - technische Anlagen	772.500,00 €	1.177.613,00 €	1.097.350,25 €	1.099.714,04 €
500	Außenanlagen	314.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	275.000,00 €	395.000,00 €	395.000,00 €	335.000,00 €
700	Baunebenkosten	820.000,00 €	995.000,00 €	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €

Summe	5.317.000,00 €	5.451.218,00 €	5.330.115,25 €	5.344.779,04 €
gerundet	5.317.000,00 €	5.452.000,00 €	5.330.000,00 €	5.345.000,00 €
zulässige Abweichung nach DIN 276/HOAI		+/- 20%	+/- 10%	
tatsächliche Abweichung		2,54%	0,24%	0,53%

#### Beauftragte Gewerke:

Rohbaugewerke: 100%

Haustechnikgewerke: 75%

Ausbaugewerke: 5%

Die erste Kostenberechnung der Architekten vom 23.09.2014 mit 6.350.000,00 € wurde seitens des Gebäudemanagements abgelehnt. Durch Änderung der Haustechnikplanung (Reduzierung Leuchten, Änderung Brandschutzkonzept, Änderung Lüftungsanlagen etc.) sowie durch Kürzung der teilweise überzogenen Einheitspreise konnte die Kostenberechnung dann im vorgegebenen Rahmen abschließen.

Kostensteigerung

unkritische  
Kostenabweichung

Kosteneinhaltung

### 3.1 Fazit/Zusammenfassung:

Sowohl Planungs- als auch Baufortschritt befinden sich im geplanten Bereich.

Laut Kostenprognose wird der Kostenrahmen voraussichtlich eingehalten.

Die Risiken werden durch kontinuierliche Überwachung auf einem Minimum gehalten, bzw. neue Risiken werden sofort analysiert und bearbeitet.

insgesamt Abweichungen

geringfügige Abweichungen

planmäßig
