

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**



| | |
|--------------------------------|--|
| <u>Bauherr:</u> | Stadt Lahr Rathausplatz 4 77933 Lahr |
| <u>Projektkosten:</u> | ca. 7,834 Mio € brutto (inkl. Baunebenkosten) |
| <u>Projektlaufzeit:</u> | 01/2018 - 12/2022 |
| <u>Projektdaten:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Baujahr Schulgebäude, Turnhalle: 1958 Ganztagesber., Mensa: 2010• Nutzfläche: 8.045 m²• Technikfläche: 572 m²• Verkehrsfläche: 3.311 m²• dreigeschossig |
| <u>Fördermittel:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Zuwendung nach dem Kommunalinvestitions- förderungsgesetz, Kapitel 2: 3,913 Mio. € bewilligt• Klimaschutz-Plus-Zuwendung: 1,200 Mio € bewilligt |

1.1 Projektbeschreibung:

Sanierung Gebäudehülle (Hauptgebäude)

Die gesamte Gebäudehülle weist starke energetische Mängel auf und entspricht weitestgehend dem Originalzustand (Baujahr 1958).

Das Flachdach der Aula wurde 1993 gedämmt. 2002 wurde darauf eine Photovoltaik-Anlage installiert. Im Zuge des Umbaus zur Ganztagschule (2010) wurde der bis dahin offene Innenhof mit einer Foliendachkonstruktion geschlossen. Durch das Flachdach dringt teilweise bei starkem Regen Wasser ins Gebäudeinnere ein, weshalb eine Sanierung dringend notwendig ist. Des Weiteren ist eine energetische Sanierung erforderlich. Die Dachfläche wird gedämmt, erhält eine neue Abdichtung und eine extensive Dachbegrünung. Der mit einer PV-Anlage ausgerüstete Teil des Daches wurde im Jahr 2003 neu abgedichtet und gedämmt und bleibt unberührt. Die Dachanschlüsse an aufgehende Bauteile werden überarbeitet und eine neue Attika wird ausgebildet. Der Blitzschutz wird erneuert.

Das Gebäude wurde in sichtbarer Beton-Skelettbauweise errichtet. Die Felder sind an der Nord- und Südfassade durch raumhohe Alu-Fenster Elemente, an der West- und Ostfassade (Eckzimmer) mit Klinkersteinen geschlossen. Die Fassaden der Aula sowie der Turnhalle und des Gymnastikraums sind als Pfosten-Riegel-Konstruktion ausgebildet. Aus bauphysikalischen Gründen werden die Stützen sowie die fensterlosen Wandflächen gedämmt. Um den Charakter des Gebäudes zu erhalten, ist gestalterisch angedacht, dass eine Vorsatzschale zum Einsatz kommt. Die Fenster Elemente und Pfosten-Riegel-Konstruktionen werden durch neue Aluminium-Elemente ersetzt. Jalousien sind vorgesehen.

Zur energetischen Ertüchtigung werden die Kellerdecken von unten gedämmt. Die Ausführung einer Frostschürze ist vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass das Gebäude, nach Durchführung der Maßnahmen, den Energieeffizienzstandard KfW 55 erreicht.

Sanierung Heizungsanlage

Der Gebäudekomplex wird durch eine Gasheizung aus dem Jahr 1989 beheizt. Diese wird durch eine

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

neue Heizungsanlage mit dem durch den GR-Beschluss vom 23.07.2018 vorgegebenem Anteil an regenerativen Energien ersetzt. Die genaue Ausführung wurde durch einen Fachingenieur geprüft und geplant. Es ist vorgesehen eine Holzpelletanlage mit einer Leistung von 100 KW und 2 Erdgas-Brennwertkesseln mit einer Leistung von je 260 KW zu installieren.

Einbau einer Lüftungsanlage

Das Gebäude verfügt aktuell nur über eine Abluftanlage für die Jungen Duschen im Erdgeschoss sowie über eine Lüftungsanlage für die Aula. Durch die energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle wird der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erforderlich. Die Turn- und Gymnastikhalle, die Umkleiden / Duschen der Mädchen sowie die innenliegenden WCs werden über eine zentrale Lüftungsanlage be- und entlüftet. Alle anderen Räume erhalten, wo erforderlich, eine dezentrale Lüftungsanlage.

Sanierung Klassenräume

Im Zuge der Klassenraumsanierung werden in den noch nicht sanierten neun Klassenräumen die bestehenden Bodenbeläge (Teppich bzw. Linoleum) ausgebaut und neue Bodenbeläge (Kautschuk) eingebaut. Die vorhandenen Einbauschränke werden demontiert und durch neue Einbauschränke ersetzt. Die Beleuchtung sowie die Elektroinstallationen werden mit dem Einbau der Akustikdecken erneuert. Die neue Beleuchtung wird in LED ausgeführt. Die vorhandenen Heizkörper werden durch neue Rippenheizkörper ersetzt. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und nötig - gereinigt.

Sanierung Verwaltungsbereich

Im Zuge interner Umstrukturierungen und der Umnutzung von Räumen werden im Verwaltungsbereich zwei zusätzliche Räume erforderlich. Durch das Einziehen einer Wand im Fachraum Kunst kann ein zusätzlicher Raum geschaffen werden. Des Weiteren wird einer der beiden Vorbereitungsräume der Fachrichtung Kunst dem Verwaltungsbereich zugeschlagen. Der noch nicht sanierte Verwaltungsbereich (Rektorat, stellvertretendes Rektorat, die beiden Sekretariate mit Stundenplanerzimmer, Sanitätsraum und Kopierraum) wird ebenfalls grundlegend saniert. Die bestehenden Bodenbeläge (Teppich bzw. Linoleum) werden ausgebaut und neue Bodenbeläge (Teppich) eingebaut. Die vorhandenen Einbauschränke werden demontiert und durch neue Einbauschränke ersetzt. Die Beleuchtung sowie die Elektroinstallationen werden erneuert. Die vorhandenen Heizkörper werden durch neue Rippenheizkörper ersetzt. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und nötig - gereinigt.

Sanierung Fachräume

Im Zuge der Fachraumsanierung (Kunst) werden in den zwei Fachräumen und dem zugehörigen Vorbereitungsraum die bestehenden Bodenbeläge (Teppich bzw. Linoleum) ausgebaut und neue Bodenbeläge (Kautschuk) eingebaut. Die vorhandenen Einbauschränke werden demontiert und durch neue Einbauschränke ersetzt. Die Beleuchtung sowie die Elektroinstallationen werden mit dem Einbau neuer Akustikdecken erneuert. Die neue Beleuchtung wird in LED ausgeführt. Die vorhandenen Heizkörper werden durch neue Rippenheizkörper ersetzt. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und nötig - gereinigt.

Sanierung Unterrichtsräume

Im Zuge interner Umstrukturierungen und Umnutzung von Räumen wird durch das Versetzen einer Wand zwei Räumen eine neue Nutzung zugewiesen. Bisher wird der eine als Gruppenraum, der andere als ein (zu) großer Lagerraum für den Hausmeister (ehem. Lehrmittelbibliothek) genutzt. Durch den Umbau

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

entstehen somit ein neuer Unterrichtsraum sowie ein kleineres Lager für den Hausmeister. Im neuen Unterrichtsraum ist auf den bestehenden Fliesenbelag ein neuer Bodenbelag (Kautschuk) aufzubringen. Die Beleuchtung sowie die Elektroinstallationen werden mit dem Einbau neuer Akustikdecken saniert. Die neue Beleuchtung wird in LED ausgeführt. Die vorhandenen Heizkörper werden durch neue Rippenheizkörper ersetzt. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und nötig - gereinigt. Zwei weitere Unterrichtsräume werden im gleichen Umfang saniert. Im Hausmeisterlager wird die Elektroinstallation erneuert.

Sanierung Sanitäranlagen

Die noch nicht sanierten Sanitäranlagen (Lehrer-WCs 1.OG, Mädchen-WCs 1.OG + 2.OG, Jungen-WC 1.OG), teilweise noch im Originalzustand von 1958, sowie der Dusch- und Umkleidebereich der Mädchen im 2.OG werden grundsaniert. Dies beinhaltet die Sanierung der gesamten Sanitär- und Heizungsinstallation einschließlich der Erneuerung der Sanitärgegenstände, die Sanierung der Beleuchtung (LED) und Elektroinstallation sowie den Einbau einer Lüftungsanlage im Duschaum. Die Fliesenbeläge werden erneuert. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und nötig - gereinigt. Neue Trennwandanlagen in den WCs und Garderobenbänke in der Umkleide werden eingebaut.

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

1.2 Projektstand:

In den Sitzungen am 18.11.2013 und 29.09.2014 hat der Gemeinderat der Sanierung des Max-Planck-Gymnasiums und 17 weiteren Schulen in den Jahren 2014 bis 2024 zugestimmt. In der Gemeinderatssitzung am 19.03.2018 wurde die Verwaltung ermächtigt gem. der aktuell geänderten Konzeption Schulsanierungsförderungsanträge für das Max-Planck-Gymnasium und 7 weitere Schulen zu stellen. Mit Schreiben vom 11.06.2018 hat das Regierungspräsidium für die Sanierungsmaßnahmen am MPG eine Förderungszuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2 in Höhe von 3.913.000,00 € bewilligt.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 17.12.2018 die Vergabe der Planerleistungen an DU+ und WPW beschlossen. Die Planungsaufträge wurden daraufhin erteilt und die Planung aufgenommen.

Die Startgespräche mit beiden Planungsbüros wurden noch im Dezember 2018 durchgeführt. Seit der KW 02/2019 findet im Zwei-Wochen-Turnus ein Planer-Jour fixe statt.

Mit Schreiben vom 18.06.2019 hat die Landeskreditbank Baden-Württemberg für die nachhaltige, energieeffiziente Sanierung des Max-Planck-Gymnasiums eine Zuwendung über das Förderprogramm "Klimaschutz-Plus" in Höhe von 1.200.000 € bewilligt.

Für den Erhalt der ergänzenden Festbetragsfinanzierung ist der KfW Effizienzhausstandard 55 der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) zu erreichen. Die erforderlichen Zusatzmaßnahmen wurden durch die Ortenauer Energieagentur und das Büro WPW zusammen mit dem Architekturbüro DU plus geprüft. Mit einem Mehraufwand im Bereich der Gebäudehülle, der Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage sowie bei den Planerhonoraren ist der KfW 55 Standard zu erreichen. In der Vorentwurfsplanung sind diese Mehraufwendungen enthalten. Darüberhinaus wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung eine extensive Dachbegrünung, Holz-Alu-Fensterelemente im Klassentrakt statt Alu-Fenster, eine zukunftsgerichtete Gebäudeleitetchnik, erforderliche zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, neue Heizflächen und die entsprechenden Planerhonorare berücksichtigt.

Durch den späten Bewilligungsbescheid müssen die geplanten Bauphasen sukzessive um knapp ein Jahr verschoben werden, was Auswirkung auf die Baupreiserhöhung hat.

Zudem hat sich in den letzten Jahren die Baupreiserhöhung mit weit über den in der Kostenermittlung berücksichtigten 3% pro Jahr entwickelt.

Die Planung befindet sich am Ende der Entwurfsplanung. Durch die Vertiefung der Planungsschärfe haben sich Detailpunkte ergeben, die in der Vorplanung nicht ersichtlich waren. Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde festgestellt, dass zusätzliche nachfolgend genannte Maßnahmen erforderlich sind: erweiterte Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Fangnetz unter dem Folienkissendach, Baustellen-WC mit Waschplatz), Entsorgung PAK-belasteter Altabdichtung, zusätzlich erforderliche Dämmung zur Erreichung der Bonus-Förderung, aufwendige Lüfterintegration in der Wandverkleidung, Stahlbauarbeiten im Bereich der Turnhalle, ergänzende Holz- und Rohbauarbeiten, aufwändigere Dachentwässerungsführung, Prüfstatik aufgrund erheblichen Eingriffs in das Tragwerk, zusätzliche Gutachten für den Schallschutz und den Nachweis der Luftdichtheit.

Es werden folgende Änderungen zur Erzielung von Einsparungen vorgenommen: Alu-Fenster statt der Holz-Alu-Fenster, Entfall der Stützen-Dämmung im Erdgeschoss, Vereinfachung des Wartungsaufstiegs auf das Dach, Heizkörper zum Teil beibehalten, Lüftungsanlage der WCs anpassen, ein Kunststofffoliendach statt Bitumendach.

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

Die Entwurfsplanung wurde abgeschlossen. Die Baugenehmigung liegt vor. Die Ausführungsplanung wird fortgesetzt und die Ausschreibungen werden vorbereitet.

Aufgrund der Überschreitung des EU-Schwellenwertes für Bauleistungen sind die Bauleistungen EU-weit auszuschreiben. Die Vorankündigungen zu den EU-weiten Ausschreibungen wurden für die relevanten Gewerke zur Reduzierung der Ausschreibungsdauer veröffentlicht.

Die Gewerke Gerüstbau, Dachabdichtung, Stahlbau, Metallbau Pfosten-Riegel-Fassade, Wärmedämmverbundsystem / Putz, Blitzschutz wurden vergeben. Das Start-Gespräch mit den ersten Gewerken fand am 20.05.20 vor Ort statt. Das Gewerk Sanitär musste drei Mal ausgeschrieben werden, um Angebote zu erhalten. Die Beauftragung wird vorbereitet. Die weiteren Gewerke Heizung und Elektro werden zur Zeit ausgeschrieben, bzw. deren Ausschreibung vorbereitet. Das Gewerk Lüftung wurde zum zweiten Mal ausgeschrieben, da bei der vorherigen Ausschreibung kein Angebot abgegeben wurde.

Coronabedingt benötigt die Schule die Turnhalle und die Gymnastikhalle für den Unterricht bis Ende der 29. KW. Aus diesem Grund wurde der Gerüstbaubeginn vom 8.6.20, um 5 Wochen, auf den 13.7.20 verschoben. Die daraufhin folgenden Arbeiten beginnen in der 30. KW am 20.07.20.

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

1.3 Projektbeteiligte:

Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.

Bauherr Stadt Lahr

Gebäudemanagement
Projektleitung/Projektmanagement
Silke Kabisch

Gebäudemanagement
Projektsteuerung
Markus Vöcking

Technisches Gebäudemanagement
Technische Projektleitung
Maria Göppert

Technisches Gebäudemanagement
Betreuung Technische Gebäudeausrüstung
Marcel Schneider

Objektplanung, Sanierung der Gebäudehülle
DU plus Hunzinger, Hähndel, Krug
Architekten, Rastatt

Technische Gebäudeausrüstung HLS, GLT
WPW GmbH, Saarbrücken / NL Freiburg

Energieberatung und -planung
Ortenauer Energieagentur / Ing.-Büro Quarti

Tragwerksplanung
Mohnke Höss Bauingenieure, Freiburg

Technische Gebäudeausrüst. Elektro, **Blitzschutz**
Vertec GmbH, Ettenheim

Prüfstatik
Dipl.-Ing Rouven Erhardt, Pforzheim

Baugrundgutachter
Ingenieurgruppe Geotechnik, Kirchzarten

SiGeKo
AiB GmbH, Lahr

Schallschutz
Dipl.-Ing (FH) Ch. Winter, Rheinstetten

Luftdichtigkeitsprüfung
Bionic3 GmbH, Beilheim

Prüfsachverständiger für RLT-Anlagen
...

Sachverständiger für Blitzschutzanlage
HSI Ingenieurgesellschaft mbH, Kehl

Ausführende Firmen:

Gerüstbau: Becker GmbH, Denzlingen,
Dachabdicht.: FAT-Flachdachbau GmbH, Lahr
Stahlbau: Winterhalter & Maurer GmbH, Malterdingen
Metallbau: Hewe GmbH, Lahr
WDVS / Putz: Lembke Fassadenbau GmbH, Karlsruhe

weitere Beauftragungen folgen

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

2.1 Qualitätssteuerung: Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.

Legende:

Erläuterung Risikoeinstufung:

W = Eintrittswahrscheinlichkeit

S = Schadensausmaß

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| W4 | niedrig | mittel | hoch | hoch |
| W3 | niedrig | mittel | mittel | hoch |
| W2 | niedrig | niedrig | mittel | mittel |
| W1 | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig |
| | S1 | S2 | S3 | S4 |

| Risikobeschreibung | Wer trägt Risiko? | Auswirkung | Risikoeinstufung | | | |
|---|--|--|------------------|---|---------|--|
| | | | W | S | Risiko | Handlungsweise |
| Allgemein: | | | | | | |
| Schlüsselperson fällt aus | Planer - Bauherr | Bauverzögerung | 1 | 2 | niedrig | Klare Vertreterstruktur erstellen |
| Ausführungsmängel | Planer - Bauherr | Bauverzögerung, Qual.verringering | 2 | 2 | niedrig | Qualität kontinuierlich kontrollieren |
| Projektbezogene Risiken: | | | | | | |
| Sanierung im Schulbetrieb | Planer - Bauherr | Bauverzögerung, Störung des Schulbetriebes | 4 | 2 | mittel | Bauphasen bilden, Bauablauf prüfen auf Beeinträchtigungen |
| Luftdichtheitsnachweis wird nicht erbracht | Planer - Bauherr | Verlust der Klimaschutz-Plus-zuwendung | 1 | 4 | niedrig | kritische Details werden vorab geprüft |
| Brandgefahr durch Brennen, Schweißen und Funkenflug | Planer/Bauleitung, Bauherr, Bauausführende | Brand oder Fehlalarm während des Schulbetriebs | 1 | 4 | niedrig | Einhaltung der Bedingungen aus dem Schweißerlaubnis-schein fordern und kontrollieren, protokollierte Unterweisung der AN zur Brandvermeidung, Bauordnung involvieren |
| Baustellenstilllegung durch Bauordnung, aufgrund der Nichteinhaltung von Auflagen | Planer/Bauleitung, Bauherr, Bauausführende | Bauverzögerung | 1 | 4 | niedrig | Brandgefahr verringern, Auflagen einhalten, Details siehe oben, Bauordnung involvieren |
| Vergaberisiko, keine Angebotsabgabe | Bauherr | Bauverzögerung, Kostenerhöhung | 4 | 3 | hoch | Hinweis an Firmen, dass Ausschreibungen am Markt sind |

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

| | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|---------------|--|
| Aufgrund Coronavirus, Änderung stadtinterner Zustimmungsverfahren, erhöhter Platzbedarf durch Schulbetrieb, Personalausfall durch Quarantäne, Krankheit | Planer/Bauleitung, Bauherr, Bauausführende | Bauverzögerung | 3 | 3 | mittel | Einhaltung der Corona-Vorschriften, Einbindung des SiGeKo, frühzeitig Reagieren auf Zwänge oder Ausfälle |
|---|--|----------------|---|---|---------------|--|

Aufgrund kontinuierlicher Analyse und Bearbeitung werden die Risiken auf ein Minimum reduziert. Die Qualität kann aufgrund der sorgfältigen Projektleitung und Projektsteuerung beibehalten werden.



Qualitätsreduzierung



Qualitätsänderungen



Beibehaltung der Qualitätsvorgaben

Projekt:


Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

2.2 Terminsteuerung: Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.

| Leistungsphasen nach HOAI "energetische Erneuerung" (Stand Rahmenterminplan 06.03.2020, DUplus) | | Zeit (geplant) | Status |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|
| LPH 1 | Grundlagenermittlung | 3 Wochen | abgeschlossen |
| LPH 2 | Vorplanung | 18 Wochen | abgeschlossen |
| LPH 3 | Entwurfsplanung | 33 Wochen | abgeschlossen |
| LPH 4 | Genehmigungsplanung | 4 Wochen | abgeschlossen |
| LPH 5 | Ausführungsplanung | 48 Wochen | In Bearbeitung |
| LPH 6 | Vorbereitung der Vergabe | 48 Wochen | In Bearbeitung |
| LPH 7 | Mitwirkung bei der Vergabe | 28 Wochen | In Bearbeitung |
| LPH 8 | Objektüberwachung BA 1 | 28 Wochen | Ab 08.06.2020 |
| LPH 8 | Objektüberwachung BA 2 | 41 Wochen | Ab 01.03.2021 |
| LPH 8 | Objektüberwachung BA 3 | 45 Wochen | Ab 24.01.2022 |
| LPH 9 | Objektbetreuung und Dokumentation | 6,1 Jahre | Ab 13.11.2020 |

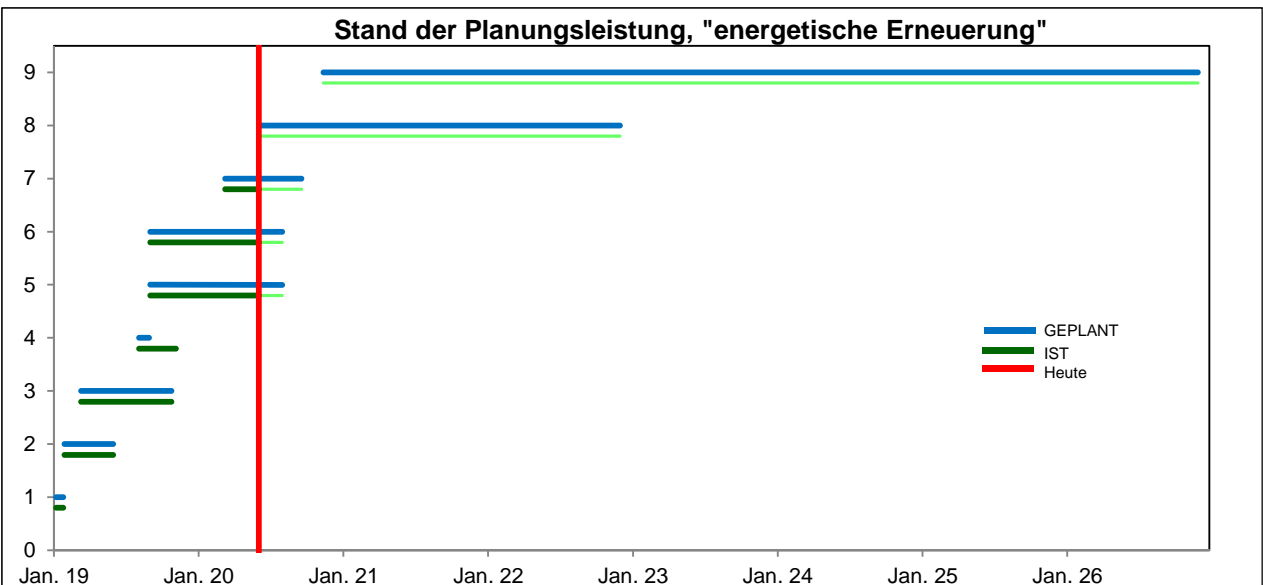


Vergabevorschriften, einschließlich der Befassung in den jeweiligen Gremien sind in der LPH 6 und 7 berücksichtigt.

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

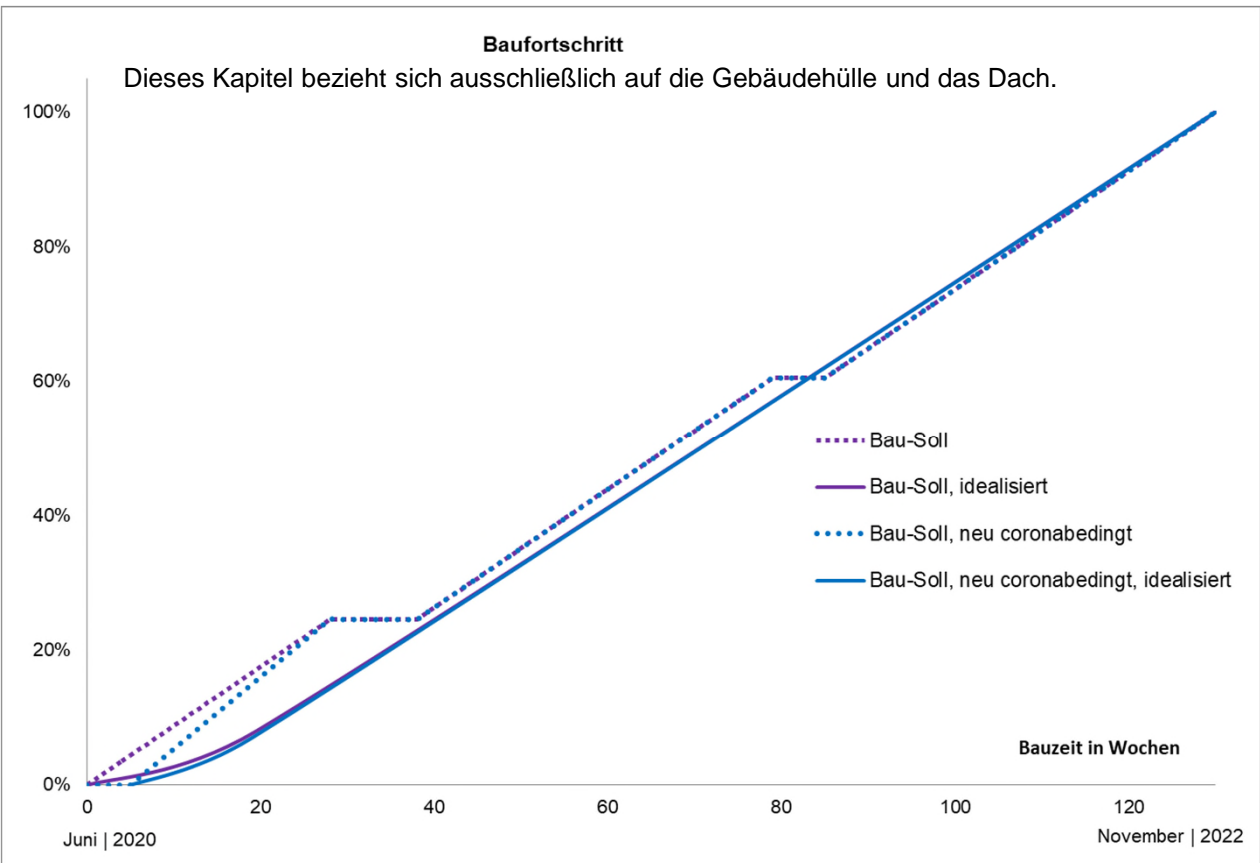

dauerhafte/kritische Abweichung

temporäre/unkritische Abweichung

planmäßig

Projekt:

Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6

Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **08.06.2020**

2.3 Kostensteuerung:

Das Gesamtbudget von Seite 1 in Höhe von 7,834 Mio € gliedert sich wie folgt auf:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gebäudehülle und Dach | 6.892.000 € |
| Sanierung Innenräume | 744.000 € |
| Sanierung WC- und Sanitärräume | 197.700 € |
| Summe | 7.833.700 € |

Bei der Sanierung der Gebäudehülle und des Daches kommen zusätzlich noch 55.000 € aus der Gebäudeunterhaltung für die Sanierung der Regenfallrohre hinzu.

Die nachfolgenden Kosten beziehen sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.

| Nr. | Gewerke | Budget | Kosten-schätzung | Kosten-berechnung ¹⁾ | Kosten-voranschlag ²⁾ | Kosten-anschlag ²⁾ | Prognose ²⁾ |
|-----|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 200 | Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | 3.978.224 € | 4.010.608 € | 4.096.118 € | 4.223.366 € | 4.389.158 € | 4.389.158 € |
| 400 | Bauwerk - technische Anlagen | 1.559.640 € | 2.372.576 € | 2.419.154 € | 2.476.371 € | 2.484.586 € | 2.484.586 € |
| 500 | Außenanlagen | 30.480 € | 0 € | 194.717 € | 194.717 € | 194.717 € | 194.717 € |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 | Baunebenkosten | 1.378.336 € | 1.468.788 € | 1.593.075 € | 1.593.075 € | 1.665.815 € | 1.665.815 € |
| | Summe | 6.946.680 € | 7.851.972 € | 8.303.064 € | 8.487.529 € | 8.734.276 € | 8.734.276 € |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| gerundet | 6.947.000 € | 7.852.000 € | 8.303.000 € | 8.734.000 € | 8.734.000 € |
| zulässige Abweichung nach DIN 276 HOAI | | | +/- 20% | +/- 10% | |
| tatsächliche Abweichung | | | 5,43% | 4,93% | -- |
| Abweichung zum Budget | | | | | 25,72% |

¹⁾ Die Kostenberechnung wurde nach vorliegender GLT-Kostenberechnung angepasst.

²⁾ Einzelne Gewerke basieren noch auf der Kostenberechnung.

Prognose Mehr/Minderkosten: 1.787.000 €

Eigenanteil der Stadt Lahr zu Projektbeginn

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Budget | 6.947.000 € |
| abzgl. Anteil Förderung KInvFG II | -3.446.000 € |
| Summe | 3.501.000 € |

Eigenanteil der Stadt Lahr, aktuell

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Prognose | 8.734.000 € |
| abzgl. Anteil Förderung KInvFG II | -3.446.000 € |
| abzgl. Klimaschutz-Plus-Förderung | -1.200.000 € |
| Summe | 4.088.000 € |

Beauftragte Gewerke:


| | |
|--------------|-------|
| Rohbau | 28,0% |
| Haustechnik | 9,4% |
| Ausbau | 56,6% |
| Summe | |

Vergabewert

| | |
|--------------------|--|
| (ohne Nachträge) | |
| 224.730 € | |
| 233.108 € | |
| 2.029.008 € | |
| 2.486.846 € | |

Anteil KG 300 + 400

| |
|--------------|
| 3,3% |
| 3,4% |
| 29,5% |
| 36,2% |



Alle Kosten sind incl. 19% Mehrwertsteuer.

Kostensteigerung

unkritische Kostenabweichung

Kosteneinhaltung

3.1 Fazit/Zusammenfassung

Die Ausführungsplanung ist fast abgeschlossen und die Vergabe der Bauaufträge hat begonnen. Aufgrund höherer Baukosten, die sich zum Teil erst mit Vertiefung der Planungsschärfe ergaben und höherer Angebotssummen, ist der erhöhte städtische Eigenanteil der Prognose nach Anrechnung der Klimaschutz-Plus-Förderung von 168.000 € auf 587.000 € gestiegen. Einsparmöglichkeiten werden untersucht.

insgesamt Abweichungen

geringfügige Abweichungen

planmäßig
