

**Projekt:**

**Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen**

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020**



<b>Bauherr:</b>	Stadt Lahr Rathausplatz 4 77933 Lahr
<b>Projektkosten:</b>	ca. 1,774 Mio € brutto (inkl. Baunebenkosten)
<b>Projektlaufzeit:</b>	01/2019 - 12/2021
<b>Projektdateien:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baujahr Mensa: 2007 Bestandsgebäude: 1965 Erweiterungsgebäude: 2006 Trockendock: 1962</li><li>• von Sanierung betroffene Schulfläche: 2.793 m<sup>2</sup></li></ul>
<b>Fördermittel:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zuwendung nach dem Kommunalinvestitions- förderungsgesetz, Kapitel 2: 476 T€ bewilligt</li><li>• Klimaschutz-Plus-Zuwendung: 335 T€ bewilligt ca. 220T€ vsl. Auszahlung</li></ul>

**1.1 Projektbeschreibung:**

**Sanierung Gebäudehülle - Bestandsgebäude**

Die Fensterelemente auf der Südseite wurden im Jahr 2013 im 1. und 2.OG zum Teil erneuert. Die übrigen fensterlosen Fassadenflächen werden mit einer Wärmedämmung und Fassadenplatten versehen und das Dach wird erneuert. Die Fenster im Erdgeschoss (Südseite) werden zum Teil ausgetauscht. Die Oberlichter im 1. und 2.OG (Nordseite) werden ausgetauscht. Die Fensterflächen an der Südseite werden noch mit einer Verschattungs- und Verdunklungsmöglichkeit ausgestattet. Es ist vorgesehen, dass das Gebäude, nach Durchführung der Maßnahmen, den Energieeffizienzstandard KfW 70 erreicht.

**Sanierung Gebäudehülle - Trockendock / GiGS**

Analog zum Bestandsgebäude ist die Dämmung der Fassaden- und Dachflächen, der Austausch aller Fenster sowie der Einbau einer Verschattungs- und Verdunklungsmöglichkeit vorgesehen. Es ist hier ebenfalls vorgesehen, dass das Gebäude, nach Durchführung der Maßnahmen, den Energieeffizienzstandard KfW 55 erreicht. Es wird ein Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert.

**Sanierung Heizungsanlage - Gesamtareal**

Die Heizungsanlage ist im Untergeschoss des Gebäudes Trockendock untergebracht und versorgt das Gesamtareal inkl. der Gebäudeteile der Theodor-Heuss-Schule und das VHS-Gebäude (Altbau der Theodor-Heuss-Schule). Die veraltete Gas-Heizungsanlage muss erneuert werden, ebenso die Hauptverteiler sowie die Unterverteiler in den einzelnen Gebäudeteilen einschl. der gesamten Regelungstechnik. Aufgrund der deutlich geringeren Investitionskosten und der guten Ökobilanz im Vergleich zu den anderen Varianten kommt Fernwärme zum Einsatz.

**Sanierung Innenräume - Mensa**

Die verputzten Wände erhalten einen Überholungsanstrich.

**Projekt:**

**Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen**

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020**

**Sanierung Unterrichts- und Verwaltungsräume - Bestandsgebäude -**

Es ist der Austausch der Bodenbeläge (Kautschuk- oder Linoleumbelag), ein Überholungsanstrich der Wände, die Montage von Akustikdecken in den Klassenräumen und die Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Klassenräumen vorgesehen.

**Sanierung Unterrichts- und Verwaltungsräume, Flurbereiche, Nebenräume - Erweiterung**

Die verputzten Wände werden neu gestrichen und die Beleuchtung in den Klassenräumen wird auf LED umgerüstet.

**Sanierung Unterrichts- und Verwaltungsräume, Flurbereiche, Nebenräume - Trockendock**

Vorgesehen ist ein Überholungsanstrich der verputzten Wände.

**Projekt:**

**Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen**

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020**

**1.2 Projektstand:**

In den Sitzungen am 18.11.2013 und 29.09.2014 hat der Gemeinderat der Sanierung der Schutterlindenbergschule und 17 weiteren Schulen in den Jahren 2014 bis 2024 zugestimmt. In der Gemeinderatssitzung am 19.03.2018 wurde die Verwaltung ermächtigt gem. der aktuell geänderten Konzeption Schulsanierungsförderungsanträge für die Schutterlindenbergschule und 7 weitere Schulen zu stellen. Am 26.03.2018 hat die Stadt Lahr einen Antrag auf Förderung nach Kommunalinvestitionsgesetz Kapitel 2 bzw. Kommunalem Sanierungsfond gestellt. Mit Schreiben vom 11.06.2018 hat das Regierungspräsidium für die Sanierungsarbeiten an der Schutterlindenbergschule eine Förderungszuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2 in Höhe von 476.000 € bewilligt.

In der Sitzung am 20.03.2019 hat der Technische Ausschuss der Sanierung der Heizzentrale mit einer Versorgung mit Fernwärme auf Grundlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs zugestimmt.

Mit Schreiben vom 22.03.2019 hat die Landeskreditbank Baden-Württemberg für die nachhaltige, energieeffiziente Sanierung der Schutterlindenbergschule eine Zuwendung über das Förderprogramm "Klimaschutz-Plus" in Höhe von 335.160 € bewilligt. Für den Erhalt der ergänzenden Festbetragsfinanzierung ist der KfW Effizienzhausstandard 55 der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) zu erreichen. Die dafür erforderlichen Zusatzmaßnahmen werden derzeit geprüft und können zu einer Erhöhung der Baukosten führen.

Nach jetzigem Stand betrifft die energetische Sanierung allenfalls 1.468 m<sup>2</sup> der Schulfläche. Voraussichtlich können daher nur rund 175.000,- € der zusätzlichen Fördermittel in Anspruch genommen werden.

Die Planung für die Gebäudehülle und die Innenraumsanierung wird seitens des Gebäudemanagements erstellt. Die Ausschreibung der ersten Gewerke wurde veranlasst, die Submissionen für den Innenausbau erfolgen in Kürze.

Im Bestandsgebäude wurde die Sanierung der Innenräume im 2.OG abgeschlossen, die Dachsanierung wurde durchgeführt und der Sonnenschutz wurde demontiert.

Der Submissionstermin für die Innenräume des Hauptgebäudes Gewerke Trockenbau-, Bodenbelags-, und Malerarbeiten hat stattgefunden, die Arbeiten werden in den Sommerferien ausgeführt. Die Verglasungsarbeiten wurden aus wirtschaftlichen Gründen neu ausgeschrieben. Der neue Submissionstermin ist Anfang März 20. Die Submission für die Sonnenschutzarbeiten war Anfang Februar 20 und wurde beauftragt. Die Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten werden in den Pfingstferien ausgeführt.

Die Ausschreibungen für die Dachdecker-, Blitzschutz-, WDVS- und Gerüstbauarbeiten des GIGS-Gebäudes kommen im März 2020 in die E-Vergabe bzw. freihändige Vergabe. Die Ausführungen finden von Anfang der Osterferien bis Ende der Sommerferien statt.

Die Installation der Fernwärme für das Gesamtareal findet im Sommer 2020 statt.

[Der Sonnenschutz wurde montiert. Die Verglasungsarbeiten werden in den Sommerferien abgeschlossen. Die Sanierung der Innenräume wird mit dem letzten Klassenzimmer in den Sommerferien 2020 abgeschlossen. Alle Klassenzimmer sind unter anderem dann auf LED-Beleuchtung umgerüstet.](#)

Projekt:

**Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen**

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020**

Die Ausführung der Dachdecker-, Blitzschutz-, Wärmedämmverbundsystem- und Gerüstbauarbeiten des GIGS-Gebäudes finden wie geplant von Beginn der Osterferien bis Ende der Sommerferien statt.

Die Installation der Fernwärme für das Gesamtareal hat begonnen.

**Projekt:**

**Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen**

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020**

**1.3 Projektbeteiligte:**

Bauherr Stadt Lahr

Gebäudemanagement  
Projektleitung/Projektmanagement  
Silke Kabisch

Gebäudemanagement  
Projektsteuerung  
Markus Vöcking

Technisches Gebäudemanagement  
Technische Projektleitung  
Julie Baumann

Technisches Gebäudemanagement  
Betreuung Technische Gebäudeausrüstung  
Marcel Schneider

Technische Gebäudeausrüstung  
Krebsler und Freyler

Energieberatung und -planung  
Ortenauer Energieagentur / Ing.-Büro Quarti

**Ausführende Firmen:**

Bodenbeläge 1: Heinr. Schmid GmbH & Co KG, Offenburg  
Bodenbeläge 2: Boden Plus KG, Kehl  
Bodenbeläge 3: Wiela GmbH, Meißenheim  
Malerarbeiten 1: Jakob Lauer GmbH, Friesenheim  
Malerarbeiten 2: Rainer Bühler, Seelbach  
Malerarbeiten 3: Maler Müller, Lahr  
Verglasungsarbeiten 1: HEWE GmbH, Lahr  
Verglasungsarbeiten 2: Winterhalter+Maurer, Malterdingen  
Verglasungsarbeiten 3: [Hogenmüller GmbH, Hohberg](#)  
Elektroarbeiten 1: Eble GmbH, Neuried  
Elektroarbeiten 2: [Bohnert GmbH, Ottenhöfen](#)  
Elektroarbeiten 3: Schwend, Lahr

Gerüstbau 1: Feser e.K., Denzlingen  
Gerüstbau 2: Limes, Lahr  
Trockenbauarbeiten 1: Hilberer GmbH, Lahr  
Trockenbauarbeiten 2: Schwarzwälder, Lahr  
Dachdeckungsarbeiten 1+2: Geiger GmbH, Lahr  
Blitzschutz 1+2: Lösch GmbH & Co KG, Offenburg  
Fernwärme: Badenova WP GmbH&Co KG, Freiburg  
Sonnenschutz: Beck, Ettenheim  
Wärmedämmverbundsystem: [Fix GmbH, Offenburg](#)  
Metallbauarbeiten 1: [Meier, Lahr](#)  
Metallbauarbeiten 2: [Bucher GmbH, Seelbach](#)  
Abbrucharbeiten: [Exakt GmbH, Teningen-Köndringen](#)

**Projekt:**

# Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020**


## 2.1 Qualitätssteuerung:

**Legende:**

Erläuterung Risikoeinstufung:

W = Eintrittswahrscheinlichkeit

S = Schadensausmaß



Risikobeschreibung	Wer trägt Risiko?	Auswirkung				
			W	S	Risiko	Handlungsweise
<b>Allgemein:</b>						
Schlüsselperson fällt aus	Planer - Bauherr	Bauverzögerung	1	2	niedrig	Klare Vertreterstruktur erstellen
Ausführungsmängel	Planer - Bauherr	Bauverzögerung, Qual.verringerung	2	2	niedrig	Qualität kontinuierlich kontrollieren
<b>Projektbezogene Risiken:</b>						
Sanierung im Schulbetrieb	Planer - Bauherr	Bauverzögerung, Störung des Schulbetriebes	2	2	niedrig	Bauphasen bilden, Bauablauf prüfen auf Beeinträchtigungen
Aufgrund Coronavirus, Personalausfall durch Quarantäne, Krankheit	Planer/Bauleitung, Bauherr, Bauausführende	Bauverzögerung	2	2	niedrig	Einhaltung der Corona-Vorschriften, frühzeitig Reagieren auf Zwänge oder Ausfälle

Aufgrund kontinuierlicher Analyse und Bearbeitung werden die Risiken auf ein Minimum reduziert. Die Qualität kann aufgrund der sorgfältigen Projektleitung und Projektsteuerung beibehalten werden.



Qualitätsreduzierung



Qualitätsänderungen



Beibehaltung der Qualitätsvorgaben

**Projekt:**


## Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020**

### 2.2 Terminsteuerung:

Leistungsphasen nach HOAI		Zeit (geplant)	Status
LPH 1	Grundlagenermittlung	34,0 Monate	In Bearbeitung
LPH 2	Vorplanung	40,0 Monate	In Bearbeitung
LPH 3	Entwurfsplanung	40,0 Monate	In Bearbeitung
LPH 4	Genehmigungsplanung	--	--
LPH 5	Ausführungsplanung	46,0 Monate	In Bearbeitung
LPH 6	Vorbereitung der Vergabe	44,8 Monate	In Bearbeitung
LPH 7	Mitwirkung bei der Vergabe	45,9 Monate	In Bearbeitung
LPH 8	Objektüberwachung	47,3 Monate	In Bearbeitung
LPH 9	Objektbetreuung und Dokumentation	96,7 Monate	In Bearbeitung

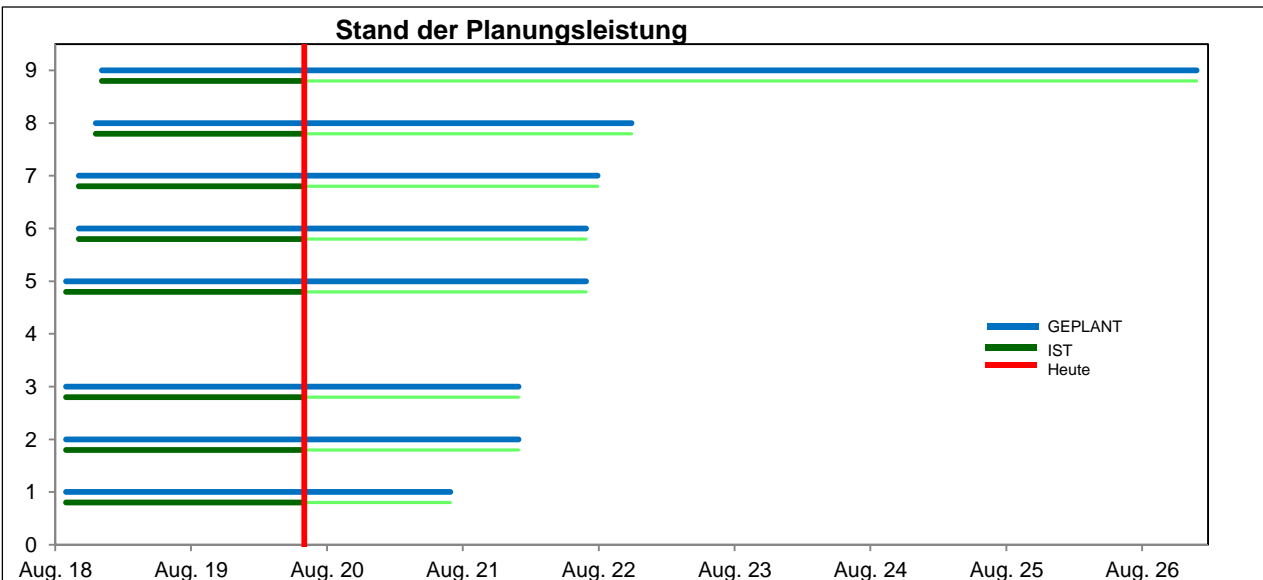


Vergabevorschriften, einschließlich der Befassung in den jeweiligen Gremien sind in der LPH 6 und 7 berücksichtigt.

**Projekt:**

## Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen

Bericht Nr.: 6 | Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020**

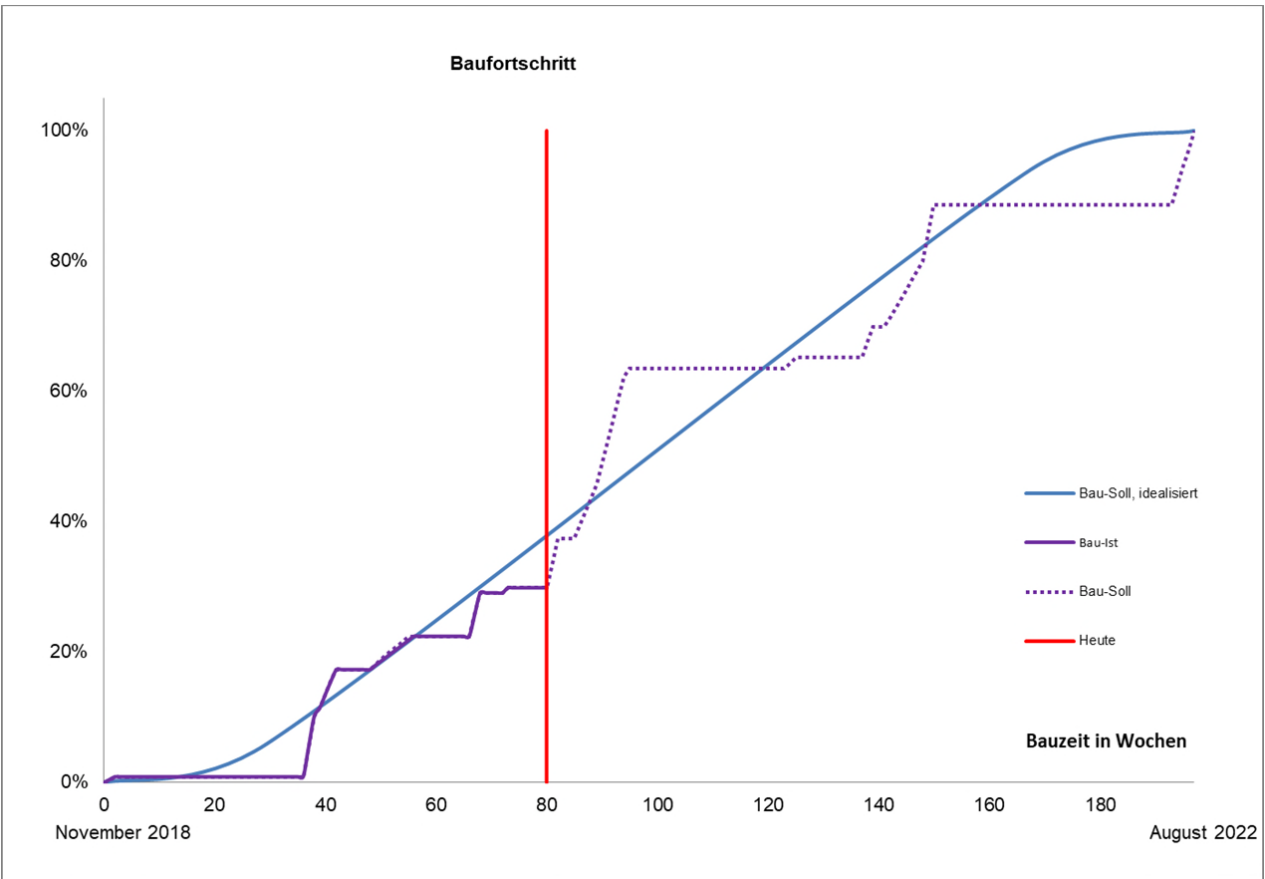

Der Bauablauf erfolgt planmäßig.

dauerhafte/kritische Abweichung

temporäre/unkritische Abweichung

planmäßig



**Projekt:****Schutterlindenbergschule, Grundschule Schulsanierungsmaßnahmen**

Bericht Nr.: 6

Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr

Sachstand: **02.06.2020****2.3 Kostensteuerung**

Nr.	Gewerke	Budget	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung *	Kosten-voranschlag *	Kosten-anschlag *	Prognose
200	Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	627.240 €	872.000 €	903.800 €	884.907 €	821.316 €	796.651 €
400	Bauwerk - technische Anlagen	837.220 €	460.000 €	454.200 €	437.761 €	435.567 €	438.563 €
500	Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
700	Baunebenkosten	309.340 €	266.000 €	151.000 €	150.060 €	150.060 €	150.060 €
	<b>Summe</b>	<b>1.773.800 €</b>	<b>1.598.000 €</b>	<b>1.509.000 €</b>	<b>1.472.728 €</b>	<b>1.406.943 €</b>	<b>1.385.274 €</b>

gerundet	1.774.000 €	1.598.000 €	1.509.000 €	1.473.000 €	1.407.000 €	1.385.000 €
zulässige Abweichung nach DIN 276 HOAI			+/- 20%		+/- 10%	
tatsächliche Abweichung			-5,90%	--	-7,25%	--
Abweichung zum Budget					--	-21,90%

\* Einzelne Gewerke basieren noch auf der vorhergehenden Kostenstufe      Prognose Mehr/Minderkosten:      --      -388.526 €

**Eigenanteil der Stadt Lahr zu Projektbeginn**

Budget	1.774.000 €
abzgl. Anteil Förderung KInvFG II	476.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.298.000 €</b>

**Eigenanteil der Stadt Lahr, aktuell**

Prognose	1.385.000 €
abzgl. Anteil Förderung KInvFG II	476.000 €
abzgl. Klimaschutz-Plus-Förderung	220.000 €
<b>Summe</b>	<b>689.000 €</b>

**Beauftragte Gewerke:**


Rohbau	73,7%
Haustechnik	24,6%
Ausbau	61,5%
<b>Summe</b>	

**Vergabewert**

(ohne Nachträge)
205.438 €
107.776 €
318.409 €
<b>631.623 €</b>

**Anteil KG 300 + 400**

16,6%
8,7%
25,8%
<b>51,1%</b>



Alle Kosten sind incl. 19% Mehrwertsteuer.



Kostensteigerung

unkritische  
Kostenabweichung

Kosteneinhaltung

**3.1 Fazit/Zusammenfassung**

Die Sanierung der Hülle des GIGS-Gebäudes hat begonnen und wird im Sommer 2020 fertiggestellt. Der Sonnenschutz im Hauptgebäude wurde abgeschlossen. Die Sanierung der Innenräume und die Verglasungsarbeiten im Hauptgebäude werden in den Pfingstferien 2020 durchgeführt.



insgesamt Abweichungen

geringfügige  
Abweichungen

planmäßig
